

APÊNDICE I

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS REFERENTES

AO PPA 2024-2027

CONTRATO DE GESTÃO 002/IGAM/2024

EXERCÍCIO 2025

Eixo I – Programas e Ações de Gestão

No ano de 2025, para o Eixo I – Programas e Ações de Gestão, estava previsto o desembolso de R\$ 2.700.000,00 conforme Deliberação CBH Paraopeba nº 21, de 19 de dezembro de 2024. O desembolso total do Eixo I foi de R\$ 319.788,14.

Estavam previstas a realização de 05 (cinco) atividades em 2025 e todas foram realizadas, na totalidade ou parcialmente. Dentre as 05 (cinco) atividades foram executadas 6 subatividades no Eixo I conforme será apresentado nas fichas de empreendimentos a seguir.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2025 -


Ações de Gestão

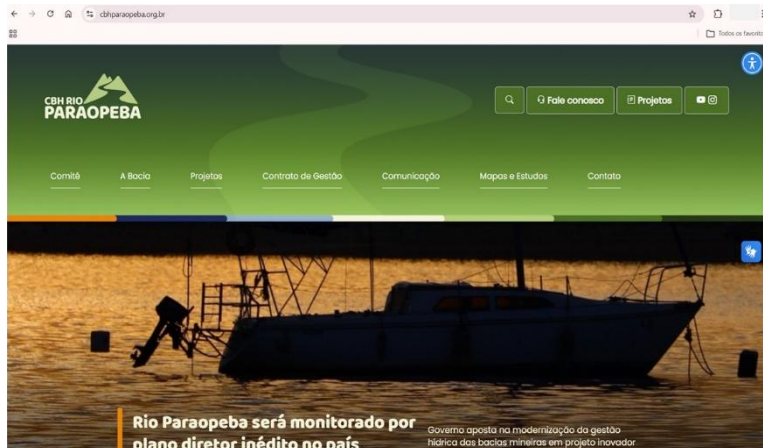
Objeto: Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Pará
Código PPA 2024-2027: I.1.1.1 - Apoio à realização e participação de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho e eventos do CBH do Rio Paraopeba
Código PIA 2025: I.1.1.1.1 - Apoio à realização e participação de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho e eventos do CBH do Rio Paraopeba
Nº do Contrato (se houver): 006/2025, 007/2025, 008/2025, 009/2025, 079/2024 e 029/2025
Data da assinatura da O.S (se houver): 31/01/2025 (passagens aéreas), 10/02/2025 (demais contratos de logística), 29/11/2024 (lanches e refeições) e 28/04/2025 (sonorização)
Contratada (se for o caso): VN Soares – Viaje Bem Mais (passagens aéreas); R Morais Agência de Turismo (locação de veículo e demais deslocamentos); Kepler (lanches e refeições) e Logun Locações (sonorização)
Objetivo: Serviços administrativos para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches dentre outros para provimento das reuniões das instâncias do Comitê
Valor previsto em 2025: R\$ 100.000,00
Valor executado em 2025: R\$ 67.055,51
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 100%
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): O valor previsto correspondeu a uma estimativa para a realização das reuniões. Entretanto, foi possível realizar todos os eventos programados com um custo inferior ao inicialmente estimado.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Em 2025 houve 1 plenária ordinária e 4 extraordinárias, todas presenciais; 5 reuniões de Câmaras Técnicas e 2 do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG).
https://cbhparaopeba.org.br/noticias6.php
https://cbhparaopeba.org.br/noticias2.php
Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Objeto: Apoio à participação e patrocínio de eventos estaduais, nacionais e internacionais
Código PPA 2024-2027: I.1.1.2 - Apoio à participação e patrocínio de eventos estaduais, nacionais e internacionais
Código PIA 2025: I.1.1.2.1 - Apoio à participação e patrocínio de eventos estaduais, nacionais e internacionais
Nº do Contrato (se houver): 006/2025, 007/2025, 008/2025, 009/2025
Data da assinatura da O.S (se houver): 31/01/2025 (passagens aéreas), 10/02/2025 (demais contratos de logística)
Contratada (se for o caso): VN Soares – Viaje Bem Mais (passagens aéreas); R Moraes Agência de Turismo (locação de veículo e demais deslocamentos)
Objetivo: Agenciamento de viagens e pagamento de despesas de viagens de membros e convidados do CBH do rio Paraopeba
Valor previsto em 2025: R\$ 86.095,84
Valor executado em 2025: R\$ 139.483,36
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 100%
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): Trata-se de uma das rubricas cujo planejamento apresenta maior complexidade, uma vez que envolve fatores alheios ao controle da Agência, tais como a variação nos preços de passagens aéreas, custos de locação de veículos e o quantitativo de representantes indicados pelo CBH Paraopeba para participação nas atividades e eventos. Durante o exercício foi observado que o valor previsto não seria suficiente para atender a demanda e por esse motivo foi proposto e aprovado pelo plenário remanejamento.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): A rubrica inclui despesas com pagamento de diárias de viagens aos membros e convidados do CBH Paraopeba para participação em atividades do interesse do Comitê. Também inclui os contratos firmados com as empresas VN Soares (passagens aéreas) e R Moraes (locação de veículo, hospedagem, embarcações e demais deslocamentos). Os contratos são compartilhados com os Comitês do rio Pará e rio das Velhas e cada um deles fica responsável por arcar com as despesas dos seus representantes.
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Presidente do CBH Paraopeba participando do Fórum Brasil das Águas – João Pessoa/PB

Objeto: Contratação de empresa para criação de logomarca e identidade visual para o CBH Paraopeba
Código PPA 2024-2027: I.1.2.1 – Criação da logomarca e identidade visual do CBH Paraopeba
Código PIA 2025: I.1.2.1.1 – Criação da logomarca e identidade visual do CBH Paraopeba
Nº do Contrato (se houver): 067/2024
Data da assinatura da O.S (se houver): 11/11/2024
Contratada (se for o caso): João Victor Monteiro Belmonte – CNPJ nº 48.393.511/0001-47
Objetivo do empreendimento: Contratação de empresa para criação de logomarca e identidade visual para o CBH Paraopeba.
Valor previsto em 2025: R\$ 12.442,95
Valor executado em 2025: R\$ 12.000,00
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso):
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 100%
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): O contrato foi executado e aprovado em 2024, porém o pagamento foi realizado em janeiro de 2025. Havia saldo no PPA para pagamento.
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Nova logomarca e trechos do Manual de Identidade Visual

Objeto: Aquisição de domínio para o novo site do CBH Paraopeba
Código PPA 2024-2027: I.1.2.2 – Domínio e criação do website Paraopeba
Código PIA 2025: I.1.2.2.1 – Domínio e criação do website Paraopeba
Nº do Contrato (se houver): 023/2025
Data da assinatura da O.S (se houver): 10/04/2025
Contratada (se for o caso): TL Publicidade e Assessoria Ltda.
Objetivo: Desenvolvimento do site do CBH Paraopeba
Valor previsto em 2025: R\$ 39.918,44
Valor executado em 2025: R\$ 40.302,69
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 100%
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): O valor executado ultrapassou o previsto em função de gastos adicionais com publicação.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): O saldo a nível PAP não foi extrapolado – R\$60.000,00.
https://cbhparaopeba.org.br/
Fotos ou imagens alusivas (se houver):


Objeto: Contratação de empresa para elaborar e executar o plano continuado de comunicação e produzir materiais de divulgação do CBH Paraopeba

Código PPA 2024-2027: I.1.2.3 – Elaboração e execução do Plano Continuado de Comunicação e Produção de Materiais de Divulgação

Código PIA 2025: I.1.2.3.1 – Elaboração e execução do Plano Continuado de Comunicação e Produção de Materiais de Divulgação

Nº do Contrato (se houver): 026/2025 (gráfica)

Data da assinatura da O.S (se houver): 23/04/2025 (gráfica)

Contratada (se for o caso): Guerra Comércio (gráfica); S.D. Comércio de Artigos de Brindes e Rilux indústria e Comércio Ltda.

Objetivo: Serviços gráficos sob demanda; Aquisição de copo térmico personalizado (parceria com o CBH rio das Velhas) e aquisição de medalhas e bottons personalizados.

Valor previsto em 2025: R\$ 2.050.000,00

Valor executado em 2025: R\$ 35.708,36

Percentual previsto para execução física até dez/2025: 100%

Percentual realizado de execução física até dez/2025: 1,74%

Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): A Agência Peixe Vivo enfrentou significativa dificuldade na obtenção de orçamentos de mercado necessários para o início do processo licitatório, o que resultou na conclusão do mapa de preços apenas em julho de 2025. A partir desse marco, o processo seguiu seu trâmite regular e atualmente, encontra-se na fase de julgamento de recursos relativos à habilitação (última etapa do processo externo). A expectativa é que a contratação da assessoria de comunicação seja finalizada até março de 2026. Ressalta-se que o valor executado em 2025 nessa rubrica refere-se exclusivamente à aquisição de materiais institucionais, realizada sob demanda do comitê.

Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):

Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Copos sendo distribuídos após dinâmica no estande do CBH Paraopeba



Medalhas personalizadas

<p>Objeto: Contratação de laboratório especializado para a realização de análises de qualidade das águas e biomonitoramento de peixes na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba conforme demandas espontâneas</p>
<p>Código PPA 2024-2027: I.2.1.1 - Monitoramento da bacia hidrográfica do rio Paraopeba</p>
<p>Código PIA 2025: I.2.1.1.1 - Contratação de Laboratório para realização de monitoramento na bacia hidrográfica do rio Paraopeba</p>
<p>N° do Contrato (se houver): 063/2025</p>
<p>Data da assinatura da O.S (se houver): 29/09/2025</p>
<p>Contratada (se for o caso): SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS – SENAI/DRMG</p>
<p>Objetivo do empreendimento: Realizar, para demandas pontuais e específicas, serviços especializados para a coleta de amostras e realização de análises laboratoriais dos parâmetros físicos, químicos e biológicos das águas superficiais e subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, com o objetivo de identificar causas de contaminação, detectar eventos críticos e fenômenos hidrológicos extremos, além de subsidiar ações corretivas e preventivas voltadas ao controle e à gestão ambiental. Inclui também a possibilidade de realização de análises amostrais de peixes, para investigação de possíveis causas de mortandades ou outras ocorrências específicas.</p>
<p>Valor previsto em 2025: R\$ 200.000,00</p>
<p>Valor executado em 2025: R\$ 25.238,22</p>
<p>Percentual previsto para execução física até dez/2025: 34%</p>
<p>Percentual realizado de execução física até dez/2025: 14%</p>
<p>Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): -</p>
<p>Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Os desembolsos do presente contrato ocorrem a partir da emissão de ordens de serviço parciais (OSPs), uma vez que os serviços são realizados sob demanda do Comitê. Os percentuais previstos no cronograma físico-financeiro são uma previsão de desembolso, mas diferentemente da maioria dos Contratos da APV, há possibilidade de saldo residual financeiro, caso as solicitações de investigações e, portanto, OSPs emitidas, não consumam o valor total do contrato. No ano de 2025 somente 1 OSP foi emitida.</p>
<p>Fotos ou imagens alusivas (se houver):</p> 



Eixo II – Programas e Ações de Planejamento

No ano de 2025, para o Eixo II – Programas e Ações de Planejamento, estava previsto o desembolso de R\$ 3.285.000,00 conforme Deliberação CBH Paraopeba nº 21, de 19 de dezembro de 2024. O desembolso total do Eixo II foi de R\$ 34.478,25.

Estava prevista a realização (parcial ou total) de 01 (uma) atividade em 2025 e ela foi realizada. Dentro dessa atividade foram executados 3 subatividades no Eixo II conforme será apresentado nas fichas de empreendimentos a seguir.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2025 -

Ações de Planejamento

Objeto: Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do rio Paraopeba – Alto Paraopeba
Código PPA 2024-2027: II.1.1.1 – Estudos de estratégias de recuperação ambiental
Código PIA 2025: II.1.1.1.1 - Elaboração de projetos do Programa Produtor de Água - Alto Paraopeba - Microbacias 01 e 02
Nº do Contrato (se houver): -
Data da assinatura da O.S (se houver): -
Contratada (se for o caso): -
Objetivo do empreendimento: Elaborar o diagnóstico e projetos básico e executivo para proteção, conservação e recuperação ambiental, em áreas selecionadas através de procedimento de manifestação de interesse, com intuito de retratar a atual situação nas microbacias em termos ambientais e socioeconômicos e propor as ações mais pertinentes para sua adequação ambiental, como subsídio para a implantação do Programa de Conservação Ambiental e Produção de Água da Bacia do Rio Paraopeba.
Valor previsto em 2025: R\$ 150.000,00
Valor executado em 2025: R\$ 1.245,77
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 5%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 0%
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): Os trâmites necessários para o encaminhamento do processo licitatório demandaram mais tempo do que o previsto inicialmente. Em razão disso, não houve tempo hábil para a execução das etapas planejadas dentro do período programado.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): No ano de 2025 foram realizadas as visitas confirmatórias às microbacias selecionadas no Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2024 e o processo de contratação da empresa para a elaboração dos projetos executivos. Portanto, os gastos ocorridos em 2025 foram relacionados a publicações e visitas técnicas.

https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2024/11/OFICIO-CIRCULAR-33-2024_Selecao-de-microbacias.pdf

<https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/procedimentos-de-manifestacao-de-interesse-projetos/>

Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Objeto: Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do rio Paraopeba – Médio Paraopeba
Código PPA 2024-2027: II.1.1.1 – Estudos de estratégias de recuperação ambiental
Código PIA 2025: II.1.1.1.2 – Elaboração de projetos do Programa Produtor de Água - Médio Paraopeba – Microbacias 01 e 02
N° do Contrato (se houver): 080/2025
Data da assinatura da O.S (se houver): 05/01/2026
Contratada (se for o caso): ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.
Objetivo do empreendimento: Elaborar o diagnóstico e projetos básico e executivo para proteção, conservação e recuperação ambiental, em áreas selecionadas através de procedimento de manifestação de interesse, com intuito de retratar a atual situação nas microbacias em termos ambientais e socioeconômicos e propor as ações mais pertinentes para sua adequação ambiental, como subsídio para a implantação do Programa de Conservação Ambiental e Produção de Água da Bacia do Rio Paraopeba.
Valor previsto em 2025: R\$ 150.000,00
Valor executado em 2025: R\$ 4.369.63
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 5%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 0%
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): Os trâmites necessários para o encaminhamento do processo licitatório demandaram mais tempo do que o previsto inicialmente. Em razão disso, não houve tempo hábil para a execução das etapas planejadas dentro do período programado.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): No ano de 2025 foram realizadas as visitas confirmatórias às microbacias selecionadas no Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2024 e o processo de contratação da empresa para a elaboração dos projetos executivos. Portanto, os gastos ocorridos em 2025 foram relacionados a publicações e visitas técnicas. O processo licitatório foi finalizado no final de 2025, a Ordem de Serviço foi emitida em 05/01/2026. https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2024/11/OFICIO-CIRCULAR-33-2024_Selecao-de-microbacias.pdf https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/procedimentos-de-manifestacao-de-interesse-projetos/ https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOGJlMmExNzktZTQ3NC00NGJlLWZTAjMTdkNTU4MmUwYmRiliwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGIxZWVhNyJ9
Fotos ou imagens alusivas (se houver):





Objeto: Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do rio Paraopeba – Baixo Paraopeba
Código PPA 2024-2027: II.1.1.1 – Estudos de estratégias de recuperação ambiental
Código PIA 2025: II.1.1.1.3 – Elaboração de projetos do Programa Produtor de Água - Baixo Paraopeba – Microbacias 01 e 02
Nº do Contrato (se houver): 081/2025
Data da assinatura da O.S (se houver): 05/01/2026
Contratada (se for o caso): GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA.
Objetivo do empreendimento: Elaborar o diagnóstico e projetos básico e executivo para proteção, conservação e recuperação ambiental, em áreas selecionadas através de procedimento de manifestação de interesse, com intuito de retratar a atual situação nas microbacias em termos ambientais e socioeconômicos e propor as ações mais pertinentes para sua adequação ambiental, como subsídio para a implantação do Programa de Conservação Ambiental e Produção de Água da Bacia do Rio Paraopeba.
Valor previsto em 2025: R\$ 150.000,00
Valor executado em 2025: R\$ 1.146.62
Percentual previsto para execução física até dez/2025: 5%
Percentual realizado de execução física até dez/2025: 0%
Principais dificuldades observadas em 2025 (se for o caso): Os trâmites necessários para o encaminhamento do processo licitatório demandaram mais tempo do que o previsto inicialmente. Em razão disso, não houve tempo hábil para a execução das etapas planejadas dentro do período programado.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): No ano de 2025 foram realizadas as visitas confirmatórias às microbacias selecionadas no Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2024 e o processo de contratação da empresa para a elaboração dos projetos executivos. Portanto, os gastos ocorridos em 2025 foram relacionados a publicações e visitas técnicas. O processo licitatório foi finalizado no final de 2025, a Ordem de Serviço foi emitida em 05/01/2026. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOGJlMmExNzktZTQ3NC00NGJlLWUwZTAzMjU4MTdkNTU4MjU1YmRiliwidCI6ImNiNTIzMDE5LTU0ZjYtNDY1OC1hNGY5LTJiMjA4ZGlxZWVhNyJ9
Fotos ou imagens alusivas (se houver):



PMI-2024 Paraopeba, Visita Pompéu/MG
-19°13'52", -45°0'9", 688,1m
17/03/2025 13:18:05



PMI-2024 Paraopeba, Visita Curvelo/MG
-18°45'8", -44°25'43", 632,8m
18/03/2025 09:09:50



Eixo III - Programas e Ações Estruturais

Foram previstos na Deliberação CBH Paraopeba nº 21, de 19 de dezembro de 2024 investimentos de R\$500.000 no Eixo III – Programas e Ações Estruturais para o ano de 2025, no entanto no decorrer do ano foram envidados esforços na contatação das empresas projetistas para a elaboração dos projetos individuais por propriedade (PIPs) das microbacias prioritárias.

No planejamento inicial, foi feita uma provisão mínima para obras, caso fosse possível finalizar a entrega do projeto de pelo menos uma microbacia e iniciar a sua execução no ano de 2025. Devido aos prazos para a finalização do processo de seleção das microbacias (Procedimento de Manifestação de Interesse CBH Paraopeba nº 01/2024) e contratação das empresas projetistas a expectativa é que os projetos individuais por propriedade sejam finalizados em 2026 e a execução das obras ocorra de 2026 adiante. Diante desta constatação foi solicitado um remanejamento do PAP, aprovado por meio da Deliberação CBH Rio Paraopeba nº 039, de 30 de outubro de 2025.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Apêndice, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 002/IGAM/2024, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em sua maioria, apesar da baixa execução financeira observada no período em análise.

Cabe destacar que a APV tem empreendido esforços significativos para o cumprimento do planejamento estabelecido, o que pode ser evidenciado pelo bom desempenho na execução física das atividades previstas para o CBH Rio Paraopeba. Considerando que o Contrato de Gestão foi firmado recentemente, no segundo semestre de 2024, é esperado um período de estruturação operacional, com duração aproximada de até três anos, destinado à articulações institucionais, organização e condução dos processos administrativos, incluindo a elaboração e publicação de editais, realização de processos licitatórios, dentre outras. Tais atividades demandam intenso envolvimento das equipes técnica e administrativa, embora, nesse estágio inicial, ainda não se reflitam em níveis mais elevados de execução financeira. A expectativa é que desembolsos mais expressivos ocorram nas fases subsequentes, de execução dos projetos.

Para os devidos ajustes no planejamento foi solicitado um remanejamento do PAP, aprovado por meio da Deliberação CBH Rio Paraopeba nº 039, de 30 de outubro de 2025.
